

JIS A 1102		骨材のふるい分け試験									
試験目的 (株)安芸砂利 受け入れた細骨材のふるい分け試験											
試料名 ① 安濃川流域産 砂						採取地 ① (株)安芸砂利 砂利工場					
粒の範囲 ① 5mm以下						試験場所 (株)安芸砂利 試験室					
採取者 中野紀生						試験者 中野紀生					
採取年月日 2025. 5. 7						試験年月日 2025. 5. 16					
(株)安芸砂利 試験室 の状態		室温 °C				湿度 %				水温 °C	
		21				66				19	
記 事											
測定区分		①				②				混合後の結果	
ふるいの呼び寸法		ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率
* 10mm		0	0	0	100						
* 5mm		0.9	0	0	100						
* 2.5mm		45.4	8	8	92						
* 1.2mm		136.1	24	32	68						
* 0.6mm		124.7	25	57	43						
* 0.3mm		96.4	18	75	25						
* 0.15mm		84.0	15	90	10						
0.075mm		47.0	9	99	1						
受皿		8.0	1	100	0						
計		549.5	100								
粗粒率		262									
試験前質量		551.0									

注1) 粗粒率は*印のふるいにとどまる量を加えて100で割る。

①安濃川流域産 砂 5mm以下

②

適 合




JIS A 1102		骨材のふるい分け試験	
試験目的 (株)安芸砂利 受け入れた粗骨材のふるい分け試験			
①安濃川流域産 砂利		①(株)安芸砂利 砂利工場	
試験料名 ②安濃川流域産 砂利		採取地 ②(株)安芸砂利 砂利工場	
粒の範囲 ①25-5, ②40-20		試験場所 (株)安芸砂利 試験室	
採取者 中野紀生		試験者 中野紀生	
採取年月日 2025.5.7		試験年月日 2025.5.10	

(株)安芸砂利 試験室 の状態	室温 °C	湿度 %	水温 °C
	21	66	19

記 事	
-----	--

測定区分	①				②				混合後の結果	
ふるいの呼び寸法	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率
50mm	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
* 40mm	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
30mm	0	0	0	100	6684	41	41	59	16	84
25mm	0	0	0	100	2020	34	75	25	30	70
* 20mm	1055	19	19	81	1699	19	94	6	49	51
15mm	1467	26	45	55	438	5	99	1	67	33
* 10mm	1592	28	73	27	125	1	100	0	84	16
* 5mm	1549	27	100	0	9	0	100	0	100	0
* 2.5mm	15	0	100	0	5	0	100	0	100	0
受皿	0	0	100	0	2	0	100	0	100	0
計	5681	100	100	0	8992	100	100	0	100	0
粗粒率	6.92				7.94				7.30	
試験前質量	5686				8999					

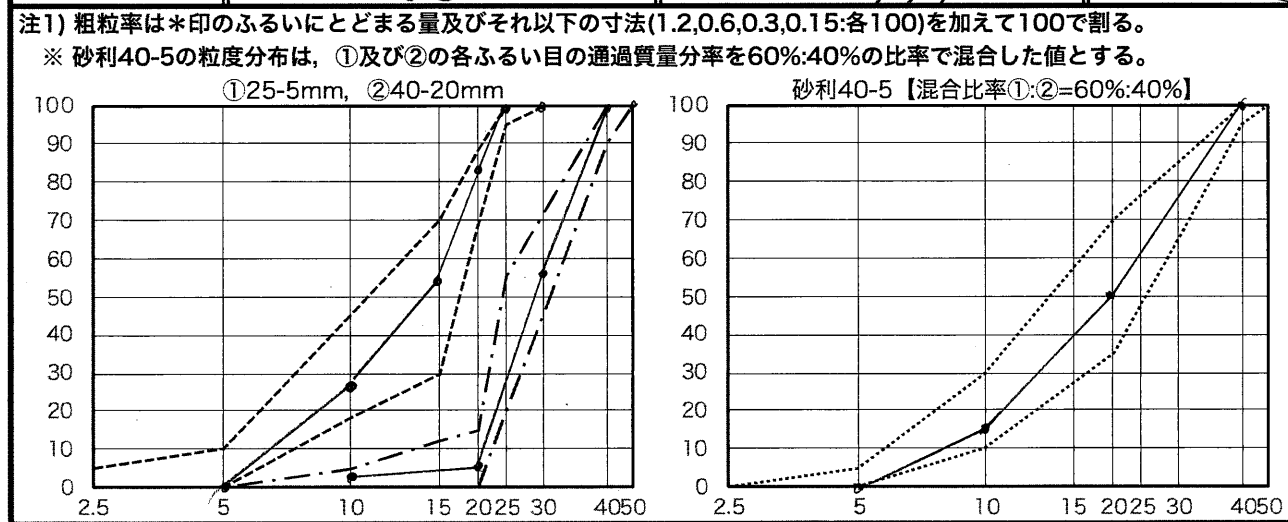

適 合



骨材試験報告書

B 第 0 0 6 0 8 0 号
2025年 5月 26日

三重県津市安濃町戸島2510番地
AGEI 株式会社 殿

〒514-0303
三重県津市雲出長常町字中浜垣内1095番地
TEL 059-
一般社団法人 三重県建設資材試験センター
中 央 試 験 場

承認署名者 技術管理者代理 武川 正巳

2025年 5月 1日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	安濃川流域	安濃川流域	安濃川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 き さ の 範 囲 ※	-----	25～5	40～20
識 別 番 号	6080-1	6080-2	6080-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/14	5/14	5/14
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 61 ✓	2. 66 ✓	2. 67 ✓
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 57 ✓	2. 64 ✓	2. 65 ✓
吸 水 率 (%)	1. 46 ✓	0. 80 ✓	0. 77 ✓
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/13	5/13	5/13
微 粒 分 量 (%)	1. 1 ✓	0. 1 ✓	0. 1 ✓
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	5/1	5/1	5/1
試 験 日	5/15	5/15	5/15
粘 土 塊 量 (%)	0. 05 ✓	0. 06 ✓	0. 05 ✓
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場 試験室			

(注)※印は依頼者申請事項

試験規格			細骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1109 : 2020			一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者	試験者
											小森	小森
依頼者			AGEI 株式会社									
受付番号			6080-1-4									
試料	種類 ※	砂 ✓										
	大きさの範囲 ※	-----										
	産地 ※	安濃川流域										
	採取場所 ※	砂利工場										
	採取日 ※	2025年 5月 1日										
試料受領年月日			2025年 5月 1日									
試験開始日			2025年 5月12日									
試験終了日			2025年 5月15日									
試験者			小森 卓也									
測定番号			1				2					
① (ピクノメータ+水)の質量 (g)			682. 8				682. 2					
② ①の計量時の水の温度 (°C)			20. 0				20. 0					
③ 密度試験用試料の表乾質量 (g)			501. 3				502. 5					
④ (ピクノメータ+水+試料)の質量 (g)			992. 2				992. 5					
⑤ ④の計量時の水の温度 (°C)			20. 0				20. 0					
⑥ ④の計量時の水の密度 (g/cm³)			0. 9982				0. 9982					
⑦ 試料の表乾密度 (③×⑥)÷(①+③-④) (g/cm³)			2. 61				2. 61					
⑧ 平均値 (g/cm³)			2. 61 ✓									
⑨ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓				0. 00 ✓					
⑩ 絶乾密度 ⑦×(④÷③) (g/cm³)			2. 57				2. 57					
⑪ 平均値 (g/cm³)			2. 57 ✓									
⑫ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓				0. 00 ✓					
⑬ 吸水率試験用試料の表乾質量 (g)			503. 1				501. 5					
⑭ 吸水率試験用試料の絶乾質量 (g)			495. 9				494. 3					
⑮ 吸水率 [(⑬-⑭)÷⑭]×100 (%)			1. 45				1. 46					
⑯ 平均値 (%)			1. 46 ✓									
⑰ 平均値からの差 (≤0.05%) (%)			0. 01 ✓				0. 00 ✓					
水温 (°C)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備考												

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合



試験規格			粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1110 : 2020			一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者 	試験者 
依 頼 者			AGEI 株式会社									
受 付 番 号			6080-2-4									
試 料	種 類 ※	砂利										
	大 き さ の 範 囲 ※	25~5										
	産 地 ※	安濃川流域										
	採 取 場 所 ※	砂利工場										
	採 取 日 ※	2025年 5月 1日										
試料受領年月日			2025年 5月 1日									
試 験 開 始 日			2025年 5月12日									
試 験 終 了 日			2025年 5月15日									
試 験 者			小森 卓也									
測 定 番 号			1					2				
① 試料の表乾試料の質量 (g)			2682. 3					2625. 7				
② 金網かごの水中質量 (g)			485. 4					485. 4				
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)			2162. 9					2123. 1				
④ 計量時の水の温度 (℃)			20. 0					20. 0				
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm³)			0. 9982					0. 9982				
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm³)			2. 66					2. 65				
⑦ 平均値 (g/cm³)			2. 66					✓				
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓					0. 01 ✓				
⑨ 試料の絶乾密度 (⑩×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm³)			2. 64					2. 63				
⑩ 平均値 (g/cm³)			2. 64					✓				
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓					0. 01 ✓				
⑫ 試料の絶乾質量 (g)			2661. 5					2604. 5				
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)			0. 78					0. 81				
⑭ 平均値 (%)			0. 80					✓				
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)			0. 02 ✓					0. 01 ✓				
水温 (℃)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備 考												

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適

合

寿内
久田

試験規格				粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1110 : 2020				一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者	試験者
												小森	小森
依 頼 者				AGEI 株式会社									
受 付 番 号				6080-3-4									
試 料	種 類 ※	砂利			✓								
	大 き さ の 範 囲 ※	40~20			✓								
	産 地 ※	安濃川流域											
	採 取 場 所 ※	砂利工場											
	採 取 日 ※	2025年 5月 1日											
試料受領年月日				2025年 5月 1日									
試 験 開 始 日				2025年 5月12日									
試 験 終 了 日				2025年 5月15日									
試 験 者				小森 卓也									
測 定 番 号				1					2				
① 試料の表乾試料の質量 (g)		4299. 2					4263. 2						
② 金網かごの水中質量 (g)		485. 4					485. 4						
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)		3180. 1					3157. 1						
④ 計量時の水の温度 (°C)		20. 0					20. 0						
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm³)		0. 9982					0. 9982						
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm³)		2. 67					2. 67						
⑦ 平均値 (g/cm³)		2. 67					✓						
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)		0. 00					0. 00						
⑨ 試料の絶乾密度 (⑫×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm³)		2. 65					2. 65						
⑩ 平均値 (g/cm³)		2. 65					✓						
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)		0. 00					0. 00						
⑫ 試料の絶乾質量 (g)		4265. 1					4231. 9						
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)		0. 80					0. 74						
⑭ 平均値 (%)		0. 77					✓						
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)		0. 03					0. 03						
水温 (°C)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970		
備 考													

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

(様式 20-12-2-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6080-1-2			
試料	種類 ※	砂 ✓			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試験開始日		2025年 5月12日			
試験終了日		2025年 5月14日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	574.6	596.4		
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	568.6	589.9		
③	0.075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)	1.0	1.1		
④	平均値 (%)	1.1			✓
⑤	平均値からの差 (≤0.5) (%)	0.1	✓	0.0	✓
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適合

内
久
田

(様式 20-12-3-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6080-2-2			
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	25~5			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試験開始日		2025年 5月12日			
試験終了日		2025年 5月14日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	2698.7	2655.7		
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	2695.3	2652.5		
③	0.075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)	0.1	0.1		
④	平均値 (%)	0.1 ✓			
⑤	平均値からの差 (≤0.3) (%)	0.0 ✓	0.0 ✓		
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

(様式 20-12-3-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		小森	武川
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6080-3-2			
試料	種類 ※	砂利 ✓			
	大きさの範囲 ※	40~20 ✓			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試験開始日		2025年 5月12日			
試験終了日		2025年 5月14日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
①	洗う前の試料の乾燥質量 (g)	4301.1	4230.2		
②	洗った後の試料の乾燥質量 (g)	4297.0	4226.4		
③	0.075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)	0.1	0.1		
④	平均値 (%)	0.1 ✓			
⑤	平均値からの差 (≤0.3) (%)	0.0 ✓	0.0 ✓		
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6080-1-3			
試料	種類 ※	砂 ✓			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試験開始日		2025年 5月13日			
試験終了日		2025年 5月16日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		187.1			
② 水洗いしたのち0.6mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		187.0			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		0.1			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.05 ✓			
備考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

内
久
田

試 験 規 格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
					
依 頼 者		AGEI 株式会社			
受 付 番 号		6080-2-3			
試 料	種 類 ※	砂利 ✓			
	大 き さ の 範 囲 ※	25~5 ✓			
	産 地 ※	安濃川流域			
	採 取 場 所 ※	砂利工場			
	採 取 日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試 験 開 始 日		2025年 5月13日			
試 験 終 了 日		2025年 5月16日			
試 験 者		武川 正巳			
測 定 番 号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		2546.8			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		2545.2			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		1.6			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.06 ✓			
備 考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合



試 験 規 格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検	印
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
					
依 頼 者		AGEI 株式会社			
受 付 番 号		6080-3-3			
試 料	種 類 ※	砂利 ✓			
	大きさの範囲 ※	40~20 ✓			
	産 地 ※	安濃川流域			
	採 取 場 所 ※	砂利工場			
	採 取 日 ※	2025年 5月 1日			
試料受領年月日		2025年 5月 1日			
試 験 開 始 日		2025年 5月13日			
試 験 終 了 日		2025年 5月16日			
試 験 者		武川 正巳			
測 定 番 号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		4176.1			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		4174.0			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		2.1			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.05 ✓			
備 考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

